







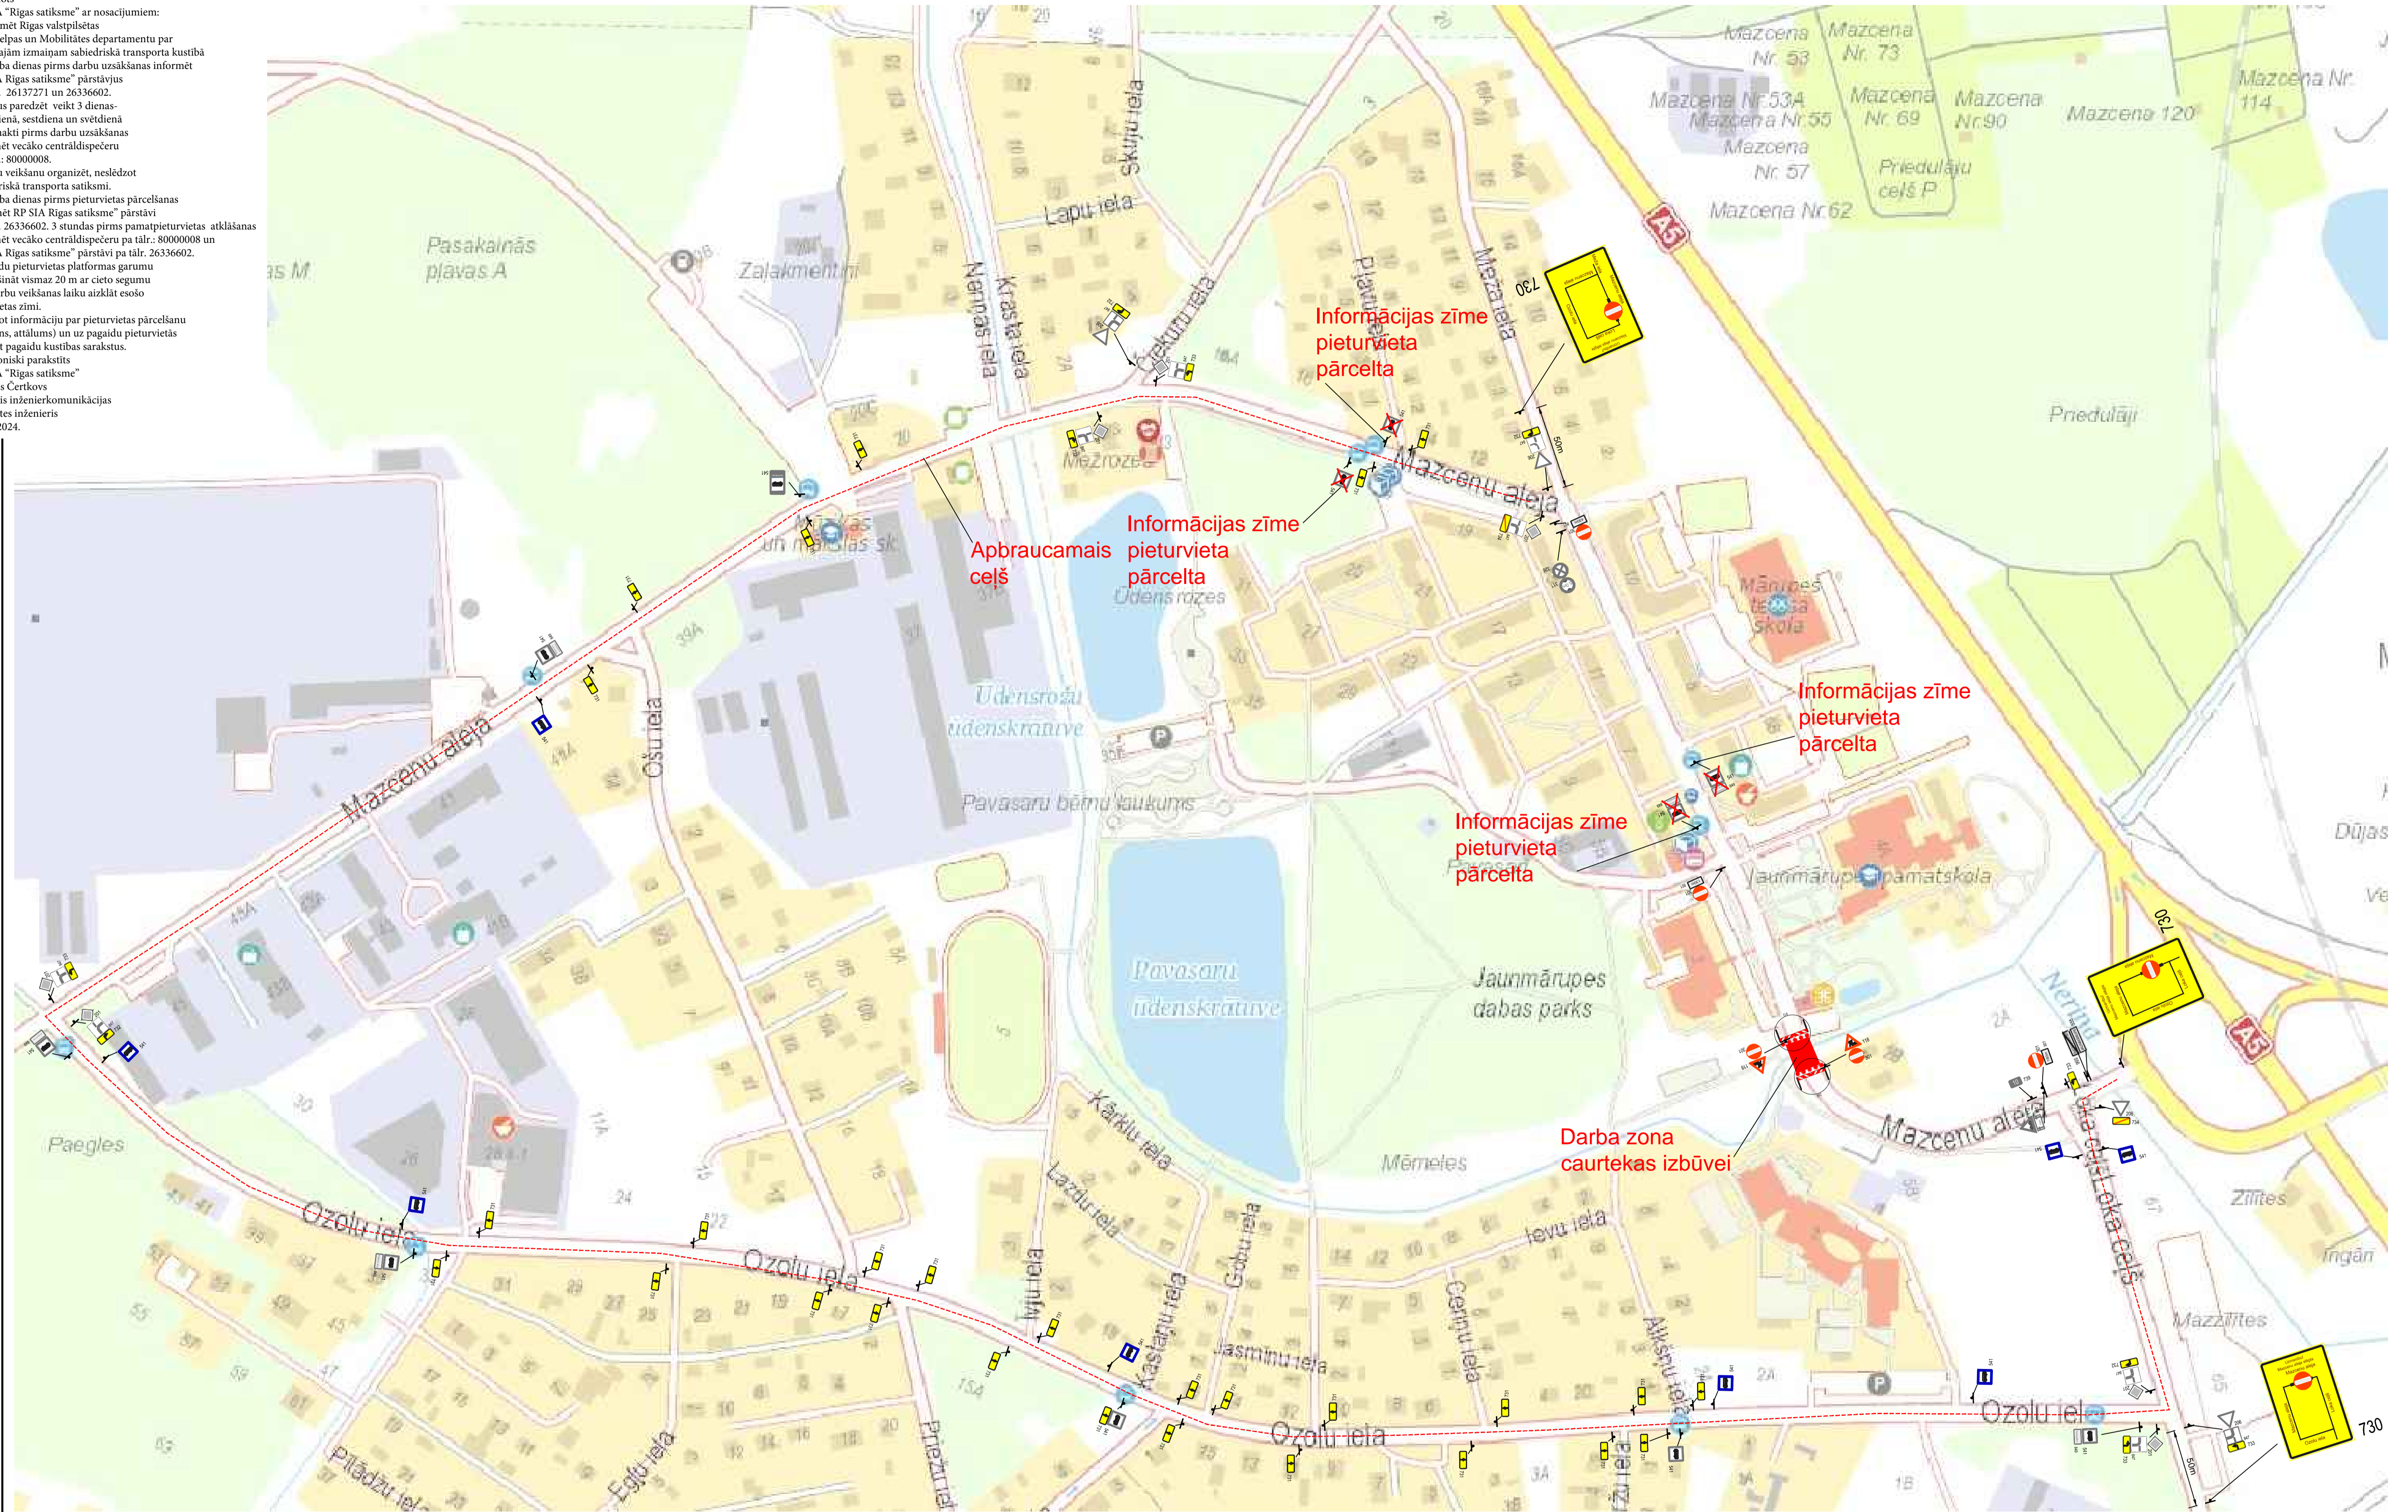

Saskaņots
 RP SIA "Rīgas satiksme" ar nosacījumiem:
 - Informēt Rīgas valstsietas un Ārtpas un Mobilitātes departamentu par plānotajām izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā
 - 5 darba dienas pirms darbu uzsākšanas informēt RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvjus pa tālr. 26137271 un 26336602.
 - Darbus paredzēt veikt 3 dienas - piektdienā, sestdienā un svētdienā
 - Dienāktī pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko centrālāsdižpeču par tālr.: 80000008.
 - Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot sabiedriskā transporta satiksmi.
 - 2 darba dienas pirms pieturvietas pārceļšanas
 - informēt RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvi pa tālr. 26336602, 3 stundas pirms pamatpieturvietas atklāšanas
 - informēt vecāko centrālāsdižpeču par tālr.: 80000008 un RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvi pa tālr. 26336602.
 - Pagaidu pieturvietas platformas garumu nodrošināt vismaz 20 m ar cieto segumu
 - Uz darbu veikšanas laiku aizklāt esošo ietuvietas zīmi.
 - Izvietot informāciju par pieturvietas pārceļšanu (virziens, attālums) un uz pagaidu pieturvietās izvietot pagaidu kustības sarakstus.
 Elektroniski parakstīts
 RP SIA "Rīgas satiksme"
 Valērijs Čertkovs
 vecākais inženierkomunikācijas
 piesaistes inženieris
 23.04.2024.



APZĪMĒJUMI

-  ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr.
-  esošās ceļa zīmes
-  demontētas ceļa zīmes
-  būvdarbu zona caurtekas izbūvei
-  būvdarbu zona lietus kanalizācijas izbūvei (darbi pa posmiem līdz 50m)
-  apbraucamais ceļš
-  sabiedriskā transporta maršruts

PIEZĪMES

1. Ceļa zīmes atbilstoši LV S 77:2016 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darbu vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Aprīkot būvdarbu ar norobežojošām barjerām.
3. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļaušanu slēgta posma objektiem.
4. Darbu veicēs SIA "BALTIJAS BŪVE" ierīko norobežojošās barjeras un tas apkalpo, mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošinot aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
5. SIA "BALTIJAS BŪVE" atbildīgais būvdarbu vadītājs - Roberts Kuiva, sert. Nr. 4-03554 mob. tālr. 26189853.
6. Darbu izpildes termiņš 3 dienas.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa aprīkojums tiek demontēts.
8. Darbus veikt pa posmiem.
9. Nodrošināt piekļaušanu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.
10. Norobežojuma barjeras Nr. 912 uzstādīt pirms satiksmi slēgtajiem ceļa darbu posmiem. Lietot vadstatņus Nr. 908/909 vai barjeras Nr. 910/911 darbu vietas norobežošanai no brauktuves Izmantot palīgbarjeras gājēju norobežošanai no darbu zonas.

Shēma 1 (caurtekas izbūve)
 Darbu izpildes termiņš 3 dienas (no 17.05.2024 līdz 19.05.2024).

<p>Saava-LV SIA "Saava-LV", Alksas iela 2, Rīga LV 1046 Vien.reģ.Nr. 40103129196, P.V.Nr. LV-40103129198 Tālr.: 7312227, 7613303, Fakss: 7313550 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3620-R</p>		<p>Pasūtītājs: SIA "BALTIJAS BŪVE"</p>					
<p>Sastādīja: S. Kazarovcevs Tālr. 26495379 e-pasts: sergejs.kazarovcevs@gmail.com</p>		<p>18.03.2024</p>		<p>Objekts: Seguma atjaunošana Mazcenu alejas posmā no Švarovnieku muižas līdz Mēz ielai Jaunmārupes, Mērupes pagasts, Mērupes novads</p>			
<p>Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma</p>		<p>Stadija: TP</p>		<p>Marka: GT</p>		<p>Lapas Nr.: 1</p>	
<p>Mērogs: bez mēroga</p>							

